

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผศส.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิมเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลทศศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ขป.๑	
๔. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ขป.๑	
๕. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ ขป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑	
๘. นางสาวกัญธารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๙. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นายสามารถ อาซากิจ		นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒
๒. นายเดชา จรรย์พัฒน์	นายช่างชลประทาน
๓. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. นายอานันท์ นิลสนธิ	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ ขป.๑	ประชุมงานคลองแม่ข่า
๒. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ดูงานแม่ปอน
๓. นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	ดูงานแม่ปอน
๔. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผศส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อ
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผศ.๑ ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และแต่งตั้งให้ นายพิทยา อิ่มเอม วศ.คส.๑ รักษาการในตำแหน่ง
๒. ตามที่สำรวจความต้องการจ้างวุฒิ ป.ตรี ของโครงการก่อสร้าง มีทั้งหมด ๑๑ คน ในปีหน้าจะสามารถจ้างได้ทั้งหมดหรือไม่ ขอให้ บท.คส.๑ สอบถาม หาข้อมูล และหลักเกณฑ์จาก สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าถ้าโครงการจะจ้างวุฒิ ป.ตรีทั้งหมดได้หรือไม่ ถ้าโครงการมีงบประมาณเพียงพอ
๓. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันเสาร์ และ อาทิตย์ อาจมีคำถามว่าทำไมจึงไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่โครงการ สาเหตุเนื่องมาจากตามที่ได้ระบุรายละเอียดในแบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะต้องไปออกไปตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานตามสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ
๔. งานพิมพ์หนังสือส่งออก ขอให้เจ้าของงานเซ็นชื่อกำกับไว้ท้ายเรื่อง หรือเซ็นกำกับห้อยท้ายชื่อของผู้ลงนามหนังสือฉบับนั้น เพื่อจะได้ทราบว่างานหนังสือฉบับนั้นๆ เป็นงานของใคร

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วศ.คส.๑ รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
รายละเอียดตามรูปตารางด้านล่าง

[illegible]

โครงการคำนวณงานการจัดทำข้อสอบโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓

[illegible]

ผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓

ลำดับ	โครงการ	เรื่องร้องเรียน / ผลการประสานงาน	หน่วยงานร้องเรียน	ตอบเป็นเอกสารเมื่อ ว/ก/ป	ความพึงพอใจ การดำเนินงาน	แนว/ผลการประสานงานต่อเนื่อง		
						ป้าไม้	ดูหมาย	อื่นๆ (ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม)
๑๒	เตือน พายุภัยพิบัติ ๒๕๕๙ อำนาจหน้าที่หน่วยงาน	ขอความอนุเคราะห์ติดตามโครงการอำนาจหน้าที่	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ โทร ๐๐๙๙.๑/๕๒๙๐-๕๖ ๔ พ.ย. ๕๙	หนังสือโครงการก่อสร้าง ที่ โทร ๐๐๙๐.๑๒/๕๐๙-๕๖ ๓๙ พ.ย. ๕๙	- จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการก่อสร้าง อำนาจหน้าที่หน่วยงาน โครงการก่อสร้าง หนังสือแจ้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนใน สำนักงานปกครองและแผนทรัพยากรธรรม- ชาติและสิ่งแวดล้อมว่าจะต้องจัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) หรือไม่			ติดต่อขอถาม ฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓ หมายเลข ๐ ๕๑๒๒-๕๖๐๐

เรื่องตอบข้อร้องเรียนและขอใช้พื้นที่ป่าเดือนเมษายน

ผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓

ลำดับ	โครงการ	เรื่องร้องเรียน / ผลการประสานงาน	หน่วยงานร้องเรียน	ตอบเป็นเอกสารเมื่อ ว/ก/ป	ความพึงพอใจ การดำเนินงาน	แนว/ผลการประสานงานต่อเนื่อง		
						ป้าไม้	ดูหมาย	อื่นๆ (ผู้รับผิดชอบ/ติดต่อสอบถาม)
๑	เตือน แม่น้ำ ๒๕๖๐ อำนาจหน้าที่หน่วยงาน	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม. ๖ ที่ ๙/๒๕๖๐ อ.ว. ๙ พ.ย. ๖๐		- นายบุญ ฤทธิชัย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ บ้านแม่ตึก แจ้งหน่วยงานราชการ ติดตามผลการดำเนินงานของ อำนาจหน้าที่ (อยู่ระหว่างดำเนินการตอบหนังสือ)			ติดต่อขอถาม ฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓ หมายเลข ๐ ๕๑๒๒-๕๖๐๐
๒	อำนาจหน้าที่หน่วยงาน	ขอทราบความก้าวหน้าโครงการอำนาจหน้าที่	สำนักงานเทศบาลตำบลอินทิล ที่ โทร ๐๕๕๐๐/๔๖๒-๕๖ ๓๙ มี.ค. ๖๐		- เทศบาลตำบลอินทิล ขอทราบความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการ และเปิดโครงการได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการตอบหนังสือ)			ติดต่อขอถาม ฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓ หมายเลข ๐ ๕๑๒๒-๕๖๐๐
๓	อำนาจหน้าที่ บ้านอภัย ๓.๔ ค.ย.๒๕๖๐ จ.เชียงใหม่	ขอความอนุเคราะห์ติดตามงานโครงการ ในการก่อสร้างอำนาจหน้าที่หน่วยงาน	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอภัย ๓.๔ ที่ ๑๓ ๔/พ.ค.๖๐ อ.ว. ๒๖ มี.ค. ๖๐		- ราษฎรบ้านอภัย ๓.๔ ค.ย.๒๕๖๐ จ.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ติดตามงานโครงการ ก่อสร้างอำนาจหน้าที่หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือ ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร (อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามดูพื้นที่ป่าไม้)	พื้นที่อยู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำ		ติดต่อขอถาม ฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓ หมายเลข ๐ ๕๑๒๒-๕๖๐๐
๔	ฝ่ายวิศวกรรม	ขอความอนุเคราะห์ติดตามงานโครงการ ในการก่อสร้างอำนาจหน้าที่หน่วยงาน	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านอภัย ๓.๔ ๓ พ.ค.๖๐ อ.ว. ๒๖ มี.ค. ๖๐		- ราษฎรบ้านอภัย ๓.๔ ค.ย.๒๕๖๐ จ.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ติดตามงานโครงการ ก่อสร้างอำนาจหน้าที่หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือ (อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามดูพื้นที่ป่าไม้)			ติดต่อขอถาม ฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ ๓ หมายเลข ๐ ๕๑๒๒-๕๖๐๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายประดู่ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
โครงการ เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) อ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา ปลัดอาวุโสอำเภอสะเมิง เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) อ่างเก็บน้ำห้วยปางหลวง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียน
บ้านแม่สาบ พร้อมด้วย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายพิทยา อิ่มเอม
วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ และผู้แทน
แต่ละหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการรับฟังวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความ
เป็นมา รายละเอียดโครงการ การศึกษา และแนวทางการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสงสัย
จากทุกภาคส่วน



วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายพิทยา อิ่มเอม วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ พบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายเหมืองหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และนำ ผชช.ออกแบบ คุณธวัช ธวัชศิริโรจน์ ผอ.บ.๑ คุณวิเชษฐ์ ด้วงาน revise แบบก่อสร้างอ่างห้วยแม่ทิม อ่างห้วยอีแต อ.จอมทอง เชียงใหม่ และอ่างห้วยผาแดง อ.ลี้ จ.ลำพูน สรุปว่าใช้ตามแบบเดิมได้ แต่ต้องมีการปรับปรุงฐานรากทุกตัว



รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้

ปัญหาของงานห้วยโทก ก็ยังเป็นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือ ทำให้งานดินยังคงล่าช้า
ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยังมียอดดินถมค้างอยู่ ประมาณ ๓๕,๐๐๐ คิว และเครื่องจักรปฏิบัติงานได้เฉลี่ยวันละ ๑,๐๐๐ คิว ผศ.๑ ให้ วศ.คส.๑ ทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๑ เน้นย้ำเรื่องงานดินจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำเนาให้ ผส.ชป.๑ และ ผส.คก. ทราบด้วย ผลงานสะสม ๙๓%





แบบ - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโศภะหรือระบบชลประทาน
บ้านห้วยโศภะ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าทุย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย
ประจำปีสิ้นสุด เมษายน 2560

กิจกรรม	จำนวนเงิน	เป้าหมาย %	พ.ศ.2559												พ.ศ.2560					หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
งานด้านวิศวกรรม																				
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	4,812,021.00	5.62	5.00	15.00				35.00	25.00	10.00	10.00									
			5.00	15.00				10.00	10.00	20.00	10.00									
				60.00				10.00	5.00	5.00	5.00	10.00								
1.2 กิจกรรมกำหนดแบบ	23,214,391.00	27.09		10.00	15.00	10.00	20.00	25.00	10.00	5.00	5.00									
				10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									
				10.00	25.00	15.00	5.00	15.00	2.00	5.00	10.00									
1.3 กิจกรรมอาคารที่พักน้ำ	3,432,300.00	4.01			5.00	5.00	20.00	25.00	25.00	15.00	5.00									
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00									
					5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00									
1.4 กิจกรรมอาคารระบายน้ำ	8,556,129.00	9.99			6.00	5.00	20.00	25.00	25.00	10.00	5.00									
					6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00									
					6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00									
1.5 กิจกรรมอาคารประกอบ	3,103,090.00	3.62			5.00	5.00	20.00	30.00	25.00	10.00	5.00									
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00									
					5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00									
1.6 กิจกรรมปรับปรุงฐานรากเดิม	18,941,234.00	22.11			10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	1.00	5.00									
					10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	1.00	5.00									
					12.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00									
1.7 กิจกรรมระบบส่งน้ำ	16,998,200.00	19.84						40.00	30.00	10.00	5.00									
								10.00	10.00	10.00	25.00									
								31.96	5.00	5.00	32.84									
1.8 ค่าจ้างรถและค่าควบคุมงาน	2,890,600.00	3.30			5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	5.00									
					5.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	5.00									
					8.00	15.00	10.00	6.00	10.00	5.00	5.00									
งานด้านโยธาและช่างเทคนิค																				
2.1 จัดทำแบบ G.C. พร้อมติดตั้ง	3,178,840.00	3.71						16.08	25.94	17.54										
								25.40	40.00	30.00	15.00	10.00	5.00							
								11.42	5.00	35.00	30.00	25.00	5.00							
2.2 จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบ	613,000.00	0.72						2.89	3.06											
								40.00	30.00	15.00	10.00	5.00								
								5.00	30.00	25.00	20.00	10.00	10.00							
รวมค่าก่อสร้าง	65,679,805.00	100.00																		
แผนงาน / เดือน (%)				3.06	8.43	6.20	15.09	28.72	20.39	10.89	6.62									
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.49	17.69	32.77	61.50	82.49	93.38	100.00									
ผลงาน / เดือน (%)				2.89	13.94	7.38	21.48	60.2	3.20	4.00	11.51	8.14	5.94	5.84	4.11	2.00	1.75	1.6		
ผลงานสะสม / เดือน (%)				2.89	16.09	23.46	25.94	31.94	35.14	39.14	50.69	72.14	77.30	83.14	87.25	89.45	91.20	93.00		
ปริมาณงาน / เดือน (%) เมื่อพิจารณาตามสัญญา				3.06	8.39	6.12	15.34	28.6	13.81	13.71	17.85	11.11	5.35	5.08	1.69					
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.42	11.54	24.88	32.84	46.71	60.43	78.29	89.44	94.79	97.81	100.00					
ผลงานจริง / เดือน (%)				2,892,802.00	7,162,691.71	5,283,694.07	12,969,994.00	4,600,986.30	11,887,282.40	31,793,825.55	15,786,696.78	4,545,263.90	4,472,165.55	1,063,072.30	313,986.80					
ผลงานจริง / เดือน (%)				2,892,802.00	9,794,653.71	15,078,257.80	21,109,072.00	26,136,170.30	40,296,453.69	31,786,278.40	47,078,977.50	36,602,141.11	35,107,336.67	32,280,294.17	31,344,214.57					

งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เหลืองานกำแพงคอนกรีต ๔๐๐ เมตร งานสะพานน้ำ ๑๒๐ เมตร เรียงกล่อง Gabion ด้านหัวและ
ด้านท้ายอาคารรับน้ำป่า ผลงานสะสม ๗๖% ผลงานตามแผน ๗๕ %

ระบบส่งน้ำฝั้งซ้าย



ระบบส่งน้ำฝั้งขวา



อาคารปลายคลองฝั้งขวา



อาคารรับน้ำป่า



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักราชเลขาธิการที่ 1

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำข้ามน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)

ตำบลแม่เงา อำเภอชุมแสง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประจำเดือน มีนาคม 2560


กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	หน่วยเงิน % ตาม วงโครงการที่มอบ 100%	พ.ศ. 2559								หมายเหตุ
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.งานดำเนินการก่อสร้าง	24,130,000.00	91.59	3.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
2.ค่าส่วนราชการและดำเนินงาน	2,270,000.00	8.41	5.000	10.00	15.00	10.00	20.00	15.00	15.00	10.00	
			5.000	10.00	10.00	30.00					
รวมราคาค่าก่อสร้าง	26,400,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	— แผนงานเดิม — ผลงานสะสม
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00	
ผลขาด / เดือน (%)			15.00	10.00	5.00	37.00	8.00				
ผลงานสะสม / เดือน (%)			15.00	25.00	30.00	67.00	75.00				

➤ งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณเมื่อต้นเดือนเมษายน อยู่ระหว่างจัดทำวัสดุ ผลงานก้าวหน้า ๕%



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง เขื่อนกั้นคลองชลประทานที่ 1
งานเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีคชชน เมษายน 2560

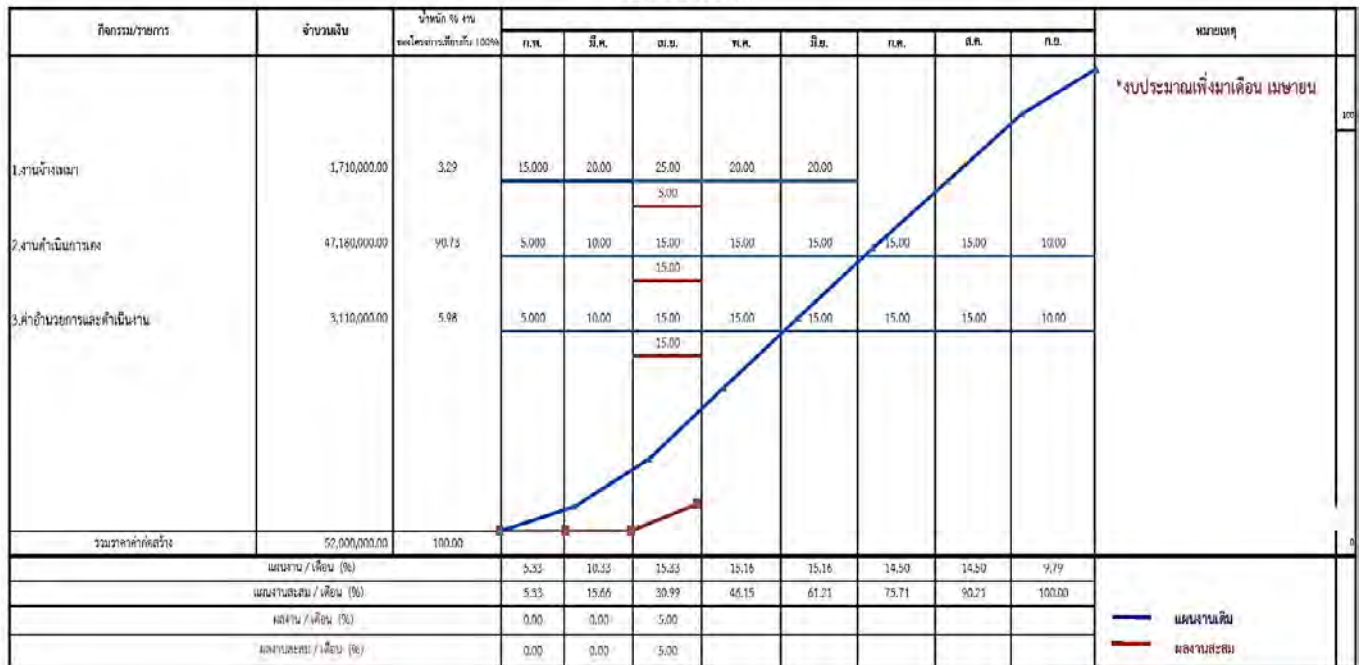

- โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอนปากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานทำ Parapet Wall ความยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดหาวัสดุ รายงานผลงานก้าวหน้า ๕ %



แผน - ควบคุมปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปึก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2560


กิจกรรมรายการ	จำนวนเงิน	บัญชี งบลงทุน งบโครงสร้างพื้นฐาน 130300	ปีงบประมาณ 2560								หมายเหตุ
			ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
1.งานจ้างเหมา	1,580,000.00	6.32	15.00	20.00	25.00	20.00	20.00				*งบประมาณเพิ่มมาเดือน เมษายน
2.งานดำเนินการก่อสร้าง	21,420,000.00	85.68	15.00	20.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
3.ค่าอำนวยความสะดวกด้านนาย	2,000,000.00	8.00	15.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง	25,000,000.00	100.00	15.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
แผนงานลงทุน / เดือน (%)			15.00	20.00	15.63	10.63	10.63	9.37	9.37	9.37	— แผนงานเดิม — ผลงานสะสม
ผลงาน / เดือน (%)			0.00	0.00	5.00						
ผลงานสะสม / เดือน (%)			0.00	0.00	5.00						

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝ่ายท่าขมิพพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาปลาตึก อ.แม่ทา จ.ลำพูน เหลือเทสันฝายอีก ๑ พับ
โครงสร้างหลักเสร็จแล้ว และจะขอปรับแผนจัดซื้อ เพื่อนำมาใช้เป็นค่าจ้างชั่วคราว วัสดุสดย่อย น้ำมันเชื้อเพลิง
ผลงานสะสม ๘๒ %



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝายทวนหมู่พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย
บ.ทวมพูน ต.ทาบลาดูก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ประจำเดือน พ.ย.59 - มิ.ย.60

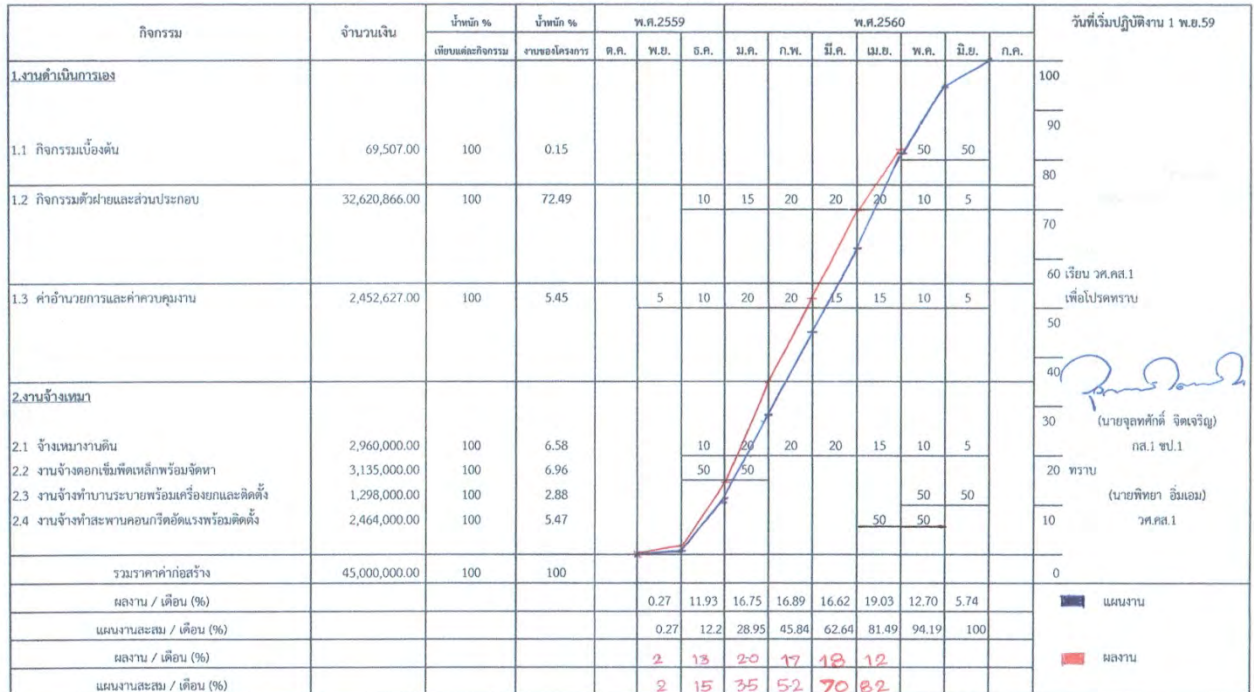

รูปปัญหาอุปสรรค.....

กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาสุวย
อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน ผลงานสะสม ๖๔.๖๔% ช้ากว่าแผน ๑๘% เนื่องจากปัญหาเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือ
ผศ.๑ ให้ กส.๒ขป.๑ พิจารณาว่าจะปรับแผนหรือไม่





แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการปรับปรุงคันดินอ่างเก็บน้ำห้วยเขื่อนลำห้วยเนื่องจากพระราชดำริ
ตำบลหนองปลาสาวย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % รวมโครงการ	พ.ศ. 2559				พ.ศ. 2560						
					พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	
1.งานดำเนินการเอง															
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	18,273,771.71	37.01		10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	100	
						5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00				
1.2 กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักร	58,000.00	ลบ.ม.	1,517,280.00	3.07			20.00	20.00	20.00	20.00				90	
							20.00	20.00	2.00	10.00	40.00				
1.3 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% SPCT	75,310.00	ลบ.ม.	3,901,058.00	7.90				5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	80	
									1.00	20.00	5.00				
1.4 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% SPCT	5,040.00	ลบ.ม.	250,236.00	0.51					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	70	
1.5 กิจกรรมปลูกข้าว Cao65% บรรจุถุง 25 กก. (3% Hydrate Lime)	63,924.00	ถุง	16,620,240.00	33.66				30.00	40.00	30.00				60	
								30.00	40.00	10.00					
1.6 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% SPCT (Stabilizing zone)	3,050.00	ลบ.ม.	174,460.00	0.35					20.00	30.00	30.00	20.00		50	
1.7 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นดิน Lime Treatment ด้วยเครื่องจักร 95%SPCT	35,000.00	ลบ.ม.	1,813,000.00	3.67				10.00	30.00	30.00	30.00			40	
									2.00	20.00	5.00				
1.8 กิจกรรมงานหินทิ้ง RockFillToe	1,240.00	ลบ.ม.	691,920.00	1.40									50.00	50.00	30
1.9 กิจกรรมงานคอนกรีตลาด GUTTER DRAIN	237.00	ลบ.ม.	934,017.00	1.89									50.00	50.00	20
1.10 กิจกรรมป้องกันการกัดเซาะ	1.00	งาน	2,054,281.00	4.16					10.00	10.00			50.00	50.00	10
1.11 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	3,149,736.29	6.38		15.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0
						20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00				
รวมราคาค่าก่อสร้าง			49,380,000.00	100.00											
แผนงาน / เดือน (%)					4.66	7.44	17.98	23.12	19.79	9.69	6.09	7.18	4.05		แผนงาน แผนงาน
แผนงานสะสม / เดือน (%)					4.66	12.10	30.08	53.20	72.99	82.68	88.77	95.95	100.00		
ผลงาน / เดือน (%)					2.81	5.59	15.37	20.28	12.59	8.00					
ผลงานสะสม / เดือน (%)					2.81	8.40	23.77	44.05	56.64	64.64					

— แผนงาน
— ผลงาน

- ฝ่ายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตัวฝายเสร็จแล้ว เหลือติดบานประตู แต่งดิน คงเหลืองานท่อส่งน้ำเข้านา งานระบบเหลืออีก ๓๐๐ เมตร ผลงานสะสม ๗๑.๕๐ % ผศส.๑ comment เรื่องฝีมืองานคอนกรีตไม่ดี ไม่สวยงาม ตามมาตรฐานจะต้องดีกว่านี้ งานเป็นไปตามแผนแต่ยังไม่ได้ มาตรฐาน งานต่อไปจะต้องดีกว่านี้



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝ่ายห้วยไคร้(ลูกที่2) พร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % ตามข้อจัดรายการ		พ.ศ.2559		พ.ศ. 2560									
						ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
1.งานค่าเป็นกรรมคง																	
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	1,408,912.27	3.81		5.00	10.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	5.00				
						3.00	10.00	25.00	20.00	20.00							
1.2 กิจกรรมฝ่ายคอนกรีต	1.00	แห่ง	12,049,941.46	32.57		5.00	10.00	25.00	25.00	20.00	15.00						
						5.00	10.00	30.00	25.00	20.00							
1.3 กิจกรรม ทราบปากคลอง	1.00	แห่ง	313,967.55	0.85					100.00								
									20.00	25.00							
1.4 กิจกรรมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	2,131.00	เมตร	20,459,480.75	55.30		5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00		
						5.00	10.00	25.00	15.00	15.00							
1.5 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	2,768,898.61	7.48		15.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00			
						15.00	20.00	15.00	10.00	10.00							
รวมราคาค่าก่อสร้าง			37,000,000.00	100.00													
แผนงาน / เดือน (%)						5.71	10.66	18.32	18.79	16.13	14.50	6.66	6.09	3.14			
แผนงานสะสม / เดือน (%)						5.71	16.37	34.69	53.48	69.61	84.11	90.77	96.86	100.00			
ผลงาน / เดือน (%)						5.63	10.66	20.14	18.54	16.53							
ผลงานสะสม / เดือน (%)						5.63	16.29	36.43	54.97	71.50							

แผนงาน

ผลงาน

➤ รายงานความก้าวหน้างานเตรียมความพร้อม งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- โครงการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อใช้แก้ปัญหาหน้าเสียของคลองแม่ข่า
ได้เข้าพื้นที่ Clearing แล้ว เตรียมทำที่พักคนงาน ผลงาน ๐.๓๕% และวันนี้ได้จัดประชุมเวทีประชาคม
ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านสบสาหนองพาน





แบบ - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่ผ่านลำเหมืองเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาภัยแล้งของคลองแม่ข้าว
ตำบลแม่ลา อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำคิด % จากของโครงการ	พ.ศ.2560						
					เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.งานตัวเงินการเอง											
1.1 กิจกรรมอาคารประกอบระบบส่งน้ำ	17.00	แห่ง	38,528,428.00	89.50		10.00	20.00	25.00	25.00	20.00	
2.งานจ้างเหมา											
2.1 งานติดตั้งเครื่องจักร	35,010	ลบ.ม.	1,115,418.60	2.59		15.00	25.00	25.00	25.00	10.00	
2.2 งานติดตั้งบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	4,442	ลบ.ม.	378,147.46	0.88		25.00	30.00	25.00	10.00	10.00	
3. ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	3,027,598.17	7.03	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	
รวมราคาก่อสร้าง			43,049,000.00	100.00	5.00						
แผนงาน / เดือน (%)					0.35	10.96	20.22	24.65	24.52	19.30	
แผนงานระยะรวม / เดือน (%)					0.35	11.32	31.53	56.18	80.70	100.00	
ผลงาน / เดือน (%)					0.35						
ผลงานระยะรวม / เดือน (%)					0.35						

— แผนงาน
— ผลงาน

- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายรูบัววน สนับสนุนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลสันทราย อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลงาน ๓.๗๔%



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายรูบัววน สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนักร้อย %	พ.ศ.2560						
					ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.งานดำเนินการก่อสร้าง											
1.1 งานคอนกรีตอาคาร	2,174.00	ลบ.ม.	9,811,911.86	49.06	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100
					5.00						90
1.2 งานอาคารประกอบระบบส่งน้ำ	6,250.00	แพ่ง	6,340,868.10	31.70			20.00	30.00	30.00	20.00	80
2.งานจ้างเหมา											60
2.1 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	12,250.00	ลบ.ม.	1,065,995.00	5.33		20.00	40.00	40.00			50
2.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	17,220.00	ลบ.ม.	406,906.70	2.03	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	40
					5.00						30
3. ค่าฮ้างน่วยการ	1.00	งาน	2,375,070.62	11.88	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20
					10.00						10
รวมราคาค่าก่อสร้าง			20,000,000.00	100.00							0
แผนงาน / เดือน (%)					3.84	11.21	21.07	24.24	22.11	17.54	
แผนงานสะสม / เดือน (%)					3.84	15.05	36.12	60.35	82.46	100.00	
ผลงาน / เดือน (%)					3.74						
ผลงานสะสม / เดือน (%)					3.74						

กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ผลงานสะสม ๘๕% เร็วกว่าแผน
คาดว่าจะงานจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ส่วนจัดสรรประเภทที่ 1
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายดินยาว
ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน % ตาม ข้อบัญญัติฉบับที่ 100	พ.ศ.2559		พ.ศ.2560							หมายเหตุ
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1.งานจ้างเหมา	4,504,200.00	15.01	15,000	20,00				40,00	25,00			
			10,000	15,00								
2.งานดำเนินการลง	25,360,700.00	84.54	5,000	15,00	20,00	20,00	15,00	10,00	10,00	5,00		
			5,000	15,00	20,00							
3.ค่าอำนาจการและดำเนินการ	135,100.00	0.45	5,000	15,00	20,00	20,00	15,00	10,00	10,00	5,00		
			5,000	15,00	20,00							
รวมราคาค่าก่อสร้าง	30,000,000.00	100.00										
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	16.00	17.00	17.00	18.00	12.00	8.00	4.00		
แผนงานตาม / เดือน (%)			5.00	22.00	29.00	56.00	13.00	86.00	95.00	99.00		
ผลงาน / เดือน (%)			10.00	10.00	25.00	15.00	25.00					
ผลงานตาม / เดือน (%)			10.00	20.00	45.00	60.00	85.00					

แผนงานเดิม

แผนงานใหม่

- ฝ่ายทุ่งใต้ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ ผศ.๑ ให้ติดตามเรื่องป่าไม้ จึงได้ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ไปที่ คุณไพโรจน์ คชสาร
ทสจ.เชียงใหม่ นัดอีกครั้งหลังสงกรานต์ จากนั้น กส.๓ ขบ.๑ จึงได้เดินทางไปติดต่อป่าไม้เอง แต่ทางป่าไม้ยังไม่ได้รับ
หนังสือจากโครงการก่อสร้าง หลังจากนั้นจะขออนุญาตหมายอีกครั้ง

กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝ่ายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานคอนกรีตตัวฝายแล้วเสร็จ ด้านหน้าฝั่งซ้ายเรียงหินด้านหน้าได้ ๓๐ เมตร เหลืองานเรียงหินด้านหน้าและด้านท้าย
ระบบส่งน้ำสาย ๑ RIMC แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างถมดินทั้ง ๒ ฝั่ง ท่อส่งน้ำเข้านา ๓ แห่ง แล้วเสร็จ ผศส.๑ ขอให้ กส.๔
ดู Gabion เรียงหินซ้าย/ขวา หน้าเขื่อนและท้ายเขื่อน เนื่องจากน้ำเยอะ งานระบบเหลืออีก ๖๐๐ เมตร
ผลงานสะสม ๗๓% ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างฝายหน้าปากฝายหรือระบบส่งน้ำ
ตำบลบางมูล อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน คิดเป็น 100%	พ.ศ.2559			พ.ศ.2560					หมายเหตุ
			ม.ค.	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.งานจ้างเหมา	7,030,000.00	4.72	15.00	20.00			40.00	25.00			
2.งานฝายหน้าปากฝาย	778,146.40	1.81									
2.1 กิจการระบายน้ำตอนบน	12,442,208.03	28.94	5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
2.2 กิจการระบายน้ำหน้าฝาย 1B/C	10,450,537.17	24.30	5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
2.3 กิจการระบายน้ำสาย 1B/C	14,747,108.38	34.00	5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
3.ค่าจ้างเหมาและค่าวัสดุ	2,552,000.00	5.93	5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
รวมรายการทั้งสิ้น	43,000,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	แผนงานเดิม โครงการปรับปรุง
แผนงาน/เดือน / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00	
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	10.00	22.00	24.00	10.00				
แผนงาน/เดือน / เดือน (%)			5.00	10.00	58.00	62.00	75.00				

- โครงการฝายหน้าปากฝาย พร้อมระบบส่งน้ำ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้นำเจ้าหน้าที่ ทสจ.แม่ฮ่องสอน ป่าไม้ และหน่วยป้องกันรักษาป่า (มส.๒) ร่วมตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง



พต.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

รายการ	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	อนุมัติแผน	รับ RQ	ร่างเอกสาร	ประกาศขาย เอกสาร	คำนวณ/ เปิดซอง	เสนอ/ ประกาศผู้ชนะ	อนุมัติรับราคา	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา
EB ชุด 1																
1 ทราย อมป.		2,908,300.00	1,733,400.00	15 มี.ค 60	27 มี.ค 60		5-18 เม.ย 60	19-24 เม.ย 60	25 เม.ย 60	28 เม.ย 60					30 วัน	
ebx14							สอบทานภายใน 12 เม.ย ถึง 20 เม.ย									
2 เหล็ก อมป.		5,150,500.00			แก้ราคากลาง	26-1 พ.ค 60	2-9 พ.ค 60	11-19 พ.ค 60	22 พ.ค 60	25 พ.ค 60					40 วัน	จ.1
ebx15ใหม่ eb18 eb20																
							สอบทานภายใน 15 พ.ค ถึง 17 พ.ค									จ.2
EB ชุด 2																
1 ปูน อมป.		2,511,600.00	1,451,572.50				10-20 เม.ย 60	21-25 เม.ย 60	26 เม.ย 60	2 พ.ค 60					40 วัน 3 ง	จ.1
ebx16							สอบทานภายใน 19 เม.ย ถึง 21 เม.ย									จ.2
2 เหล็ก อมป.		4,142,900.00			แก้ราคากลาง		26-3 พ.ค 60	4-9 พ.ค 60	11 พ.ค 60	17 พ.ค 60					40 วัน 3 ง	จ.1
ebx17/eb19																
							สอบทานภายใน 2 พ.ค ถึง 5 พ.ค									จ.2
3 เหล็ก คมข eb21		6,764,000.00				1-4 พ.ค 60	5-16 พ.ค 60	17-24 พ.ค 60	25 พ.ค 60	30 พ.ค 60						
							สอบทานภายใน 18 พ.ค ถึง 22 พ.ค									
4 ทรายประกอบสังกะสี		2,741,200.00					3-11 พ.ค 60	15-18 พ.ค 60	19 พ.ค 60	24 พ.ค 60					30 วัน	จ.1
สกลและสารประกอบสังกะสี							สอบทานภายใน 11 พ.ค ถึง 16 พ.ค									จ.2
สีผสมสีกับคอนกรีต																
eb 22																

รายการ	วงเงิน	รับราคา	อนุมัติแผน	รับ RQ	ประกาศ-ยื่น เปิดซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ชนะ อนุมัติรับราคา	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง
สอบชุด 1												
ส30 หินใหญ่ อมป.	1,830,700.00	1,830,612.00	15 มี.ค 60	27 มี.ค 60	7-18 เม.ย 60	20 เม.ย 60	25 เม.ย 60					30
ส31 ปูน อมป.	992,400.00	728,227.50			"	"	"					30 2 ง
ส32 แผ่นใยสังเคราะห์ อมป.	640,700.00	634,480.00			"	"	"					
ส33 คอนกรีตผสมเสร็จ อมป.	1,980,000.00	1,962,000.00			"	"	"					
สอบชุด 2												
ส34 แผ่นไม้อัด อมป.	1,055,000.00	813,390.00			11-21 เม.ย 60	25 เม.ย 60	28 เม.ย 60					5
ส35 ดินลูกรัง อมป.	652,000.00	243,908.00			"	"	"					30
ส36 แผ่นหินผิวทางสังเคราะห์ อมป.	1,641,300.00	1,529,780.00			"	"	"					30
ส37 หินย้อย เบอร์ 2 อมป.	682,400.00	679,635.00			"	"	"					30
สอบชุด 3												
ส38 คอนกรีตผสมเสร็จ อมป.	1,434,400.00	1,433,748.00			18-28 เม.ย 60	2 พ.ค 60	5 พ.ค 60					60
ส39 แผ่นไม้อัด อมป.	1,229,700.00	948,240.00			"	"	"					5
ส40 กรวดเบอร์ 2 อมป.	1,983,400.00	1,917,277.00			"	"	"					30
ส41 ทรายหยาบ อมป.	837,300.00	768,537.00			"	"	"					30
สอบชุด 4												
ส42 หินใหญ่ อมป.	761,600.00	758,991.00			19 เม.ย-1 พ.ค 60	3 พ.ค 60	8 พ.ค 60					30
ส43 แผ่นหินผิวทางสังเคราะห์ อมป.	1,278,800.00	1,251,000.00			"	"	"					30
ส45 ดินลูกรัง อมป.	1,314,300.00	1,126,202.00			"	"	"					30
สอบชุด 5												
ส46 หินย้อย คมข	664,300.00				27 เม.ย-8 พ.ค 60	11 พ.ค 60	17 พ.ค 60					
ส47 ปูน คมข	1,527,000.00				"	"	"					
ส48 คอนกรีตผสมเสร็จ ฝรบ	1,968,800.00				"	"	"					
ส49 หินใหญ่ ฝรบ	943,700.00				"	"	"					120 4 ง
สอบชุด 6												
ส50 กรวด # 2 ฝรบ	605,600.00				4-15 พ.ค 60	17 พ.ค 60	19 พ.ค 60					120 4 ง
ส51 ปูน ฝรบ	1,099,500.00				"	"	"					
ส52 คอนกรีตผสมเสร็จ คมข	1,978,800.00				"	"	"					90 3 ง

สอปชุด 7												
ส53	หินย่อย #2 ฝรบ	977,500.00				8-18mm 60	22 พ.ค 60	25 พ.ค 60				
ส54	ดินถม คมข	1,996,800.00				"	"	"				
ส55	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือ	1,712,900.00				"	"	"				
	วัดพฤติกรรมการเชื่อม อมป											
สอปชุด 8												
ส55	ทรายหยาบ ฝรบ	1,715,100.00				11-22 mm 60	24 พ.ค 60	26 พ.ค 60				
ส56	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือ	1,580,200.00				"	"	"				
	วัดพฤติกรรมการเชื่อม อมป											
ส56	วัสดุทำบาน คมข	686,300.00										
สอปชุด 9												
ส57	จ้างงานวัน ฝรบ	1,970,000.00				รบก/สเปค						
กรณีพิเศษ												
1	ไม้แปรรูป อมป.	1,953,900.00	1,953,927.75			7 เม.ย 60			สนองรับราคา			
2	ไม้แปรรูป อมป.	2,451,000.00	2,450,713.38			11 เม.ย 60			3 พค 60			
3	ไม้แปรรูป ฝรบ.	795,100.00				1 พค 60	5 พค 60					
4	ไม้แปรรูป คมข.	10,642,900.00				25 เม.ย 60	1 พค 60					
									ประกาศราคากลาง			
	เบ็ดเตล็ด อมป	498,939.00										
	เบ็ดเตล็ด อมป	499,860.00										
	เบ็ดเตล็ด คมข	98,818.00										
	เบ็ดเตล็ด ฝรบ	98,856.00										

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

- ฝ่ายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๘๙.๐๓%
- ระบบส่งน้ำฝ่ายดินธาตุ เบิกจ่ายได้ ๙๔.๔๓%
- ฝ่ายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๗๒.๑๙%
- ระบบส่งน้ำฝ่ายน้ำแม่เงา เบิกจ่ายได้ ๙๓.๔๗%
- ฝ่ายท่าซมพู พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๘๔.๓๑%
- อ่างเก็บน้ำห้วยเหี่ยว เบิกจ่ายได้ ๖๔.๗๘%

งบประมาณปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

- เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ณาปาก เบิกจ่ายได้ ๓.๑๕%
- เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอน เบิกจ่ายได้ ๑.๘๙%
- โครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สา เบิกจ่ายได้ ๐.๔๕%
- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายภูบัววน เบิกจ่ายได้ ๐.๙๖%

รท.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหาร ดังนี้

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ จัดทำเสร็จแล้ว
- เรื่องใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ขอให้ถ่ายรูปให้สามารถอ่านข้อความในใบสมัครได้ชัดเจนด้วย

ขก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- รายงานการใช้น้ำมันเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๓๐๒ ลิตร ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๐ ๑๓ %
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗,๙๔๑ หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๐ ๖%

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,571	2013	28%	-	-
กุมภาพันธ์	1,907	1873	-	2%	-
มีนาคม	2,060	1501	-	27%	-
เมษายน	1,404	1302	-	7%	ลดลงจากเดือน มี.ค. 60 ประมาณ 13%
พฤษภาคม	1,918	-	-	-	-
มิถุนายน	1,546	-	-	-	-
กรกฎาคม	1,561	-	-	-	-
สิงหาคม	1,349	-	-	-	-
กันยายน	1,107	-	-	-	-
ตุลาคม	868	-	-	-	-
พฤศจิกายน	3,412	-	-	-	-
ธันวาคม	1,618	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	5759	4899	-	15%	-
กุมภาพันธ์	4255	4721	11%	-	-
มีนาคม	7358	7522	22%	-	-
เมษายน	8414	7941	-	6%	เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 60 ประมาณ 6%
พฤษภาคม	9878	-	-	-	-
มิถุนายน	9201	-	-	-	-
กรกฎาคม	7883	-	-	-	-
สิงหาคม	8210	-	-	-	-
กันยายน	8580	-	-	-	-
ตุลาคม	7443	-	-	-	-
พฤศจิกายน	7874	-	-	-	-
ธันวาคม	6588	-	-	-	-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ โดย วศ.คส๑

๑. เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ และงบเพิ่มเติม ปี ๒๕๖๐

๒. การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

- งานจ้างเหมา

- งานดิน

- งานคอนกรีต

- งานดำเนินการเอง (การทดสอบเหมือนงานจ้างเหมา)

➤ กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม
