

รายงานการประชุมประจำเดือน  
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑	ประธาน
๒. นายจุลศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๓. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ ชป.๑	
๔. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๕. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ ชป.๑	
๖. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗. นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑	
๘. นางสาวกัญธารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒
๒. นางสุวิมล ปินตา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓. นายเดชา จรรย์พัฒน์	นายช่างชลประทาน
๔. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๕. นายอานันท์ นิลสนธิ	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	ไปราชการ
๒. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ดูงานแม่ปอน
๓. นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	ไปราชการ
๔. นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	ดูงานแม่ปอน
๕. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	ไปสัมมนา
๖. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	ไปสัมมนา

เริ่มประชุมเวลา

๑๓.๓๐ น.

นายพิทยา อิ่มเอม วศ.คส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แทน ผคส.๑ ซึ่งไปราชการและให้  
นางจินตนา ชูดวง ทำหน้าที่เลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

### ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

➤ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ผส.ขป.๑ ขอเชิญประชุมประจำเดือน หาก กส.๑-๔ ขป.๑ ไม่ติดงานที่ไหน อยากให้เข้าร่วมประชุมด้วย

### ระเบียบวาระที่ ๒      รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

### ระเบียบวาระที่ ๓      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วค.คส.๑ รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า

- การตอบเรื่องร้องเรียนและการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทิม อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง ไม่ต้องทำรายงานสิ่งแวดล้อม IEE แต่ให้ทำเป็น Check list และจะจัดเข้าแผนในปี ๒๕๖๒

งานเพิ่มเติม งบประมาณปี ๒๕๖๐

- งานเพิ่มเติมทั้งหมด ๔ งาน ได้แก่ แม่น้ำป้าก ภูบัวน แม่ปอน และคลองแม่ข่า ใบบังสรรงบประมาณออกแล้ว ทุกงานเริ่มทุกอย่างได้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้

ปัญหาของงานห้วยโทก ก็ยังเป็นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือ ทำให้งานดินยังคงล่าช้า ปริมาณดินถมบดอัดแน่นสะสมจนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เพียง ๑๖,๐๐๐ ลบ.ม. ไม่ถึงยอดตามข้อตกลง งวดที่ ๑ จำนวน ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม. ยังค้างอยู่ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ลบ.ม. ผลงานสะสม ๙๑% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐



### ปัญหาในการดำเนินงาน


๑. ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์แทรกเตอร์ที่ ๑ ถอนเครื่องจักรไปช่วยอุทกภัยภาคใต้และประมาณกลางเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เครื่องจักรที่กลับมาไม่มีสภาพไม่พร้อมจะทำงานต้องซ่อมบ่อยและรออะไหล่ บางคันต้องรอขนย้ายจากโครงการอื่น ๆ ที่ศูนย์แทรกเตอร์ที่ ๑ ไปปฏิบัติงานอยู่

๒. ปริมาณงานดินถมบดอัดแน่นของหน่วยแทรกเตอร์ไม่เคยถึง ๕๐๐ ลบ.ม./ต่อวัน ในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทางโครงการก่อสร้างได้แจ้งเร่งรัด ผอ.ศูนย์และหัวหน้าฝ่ายแทรกเตอร์มาโดยตลอด

๓. วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ผส.ชป.๑ ได้เชิญผู้อำนวยการศูนย์แทรกเตอร์ที่ ๑ หัวหน้าฝ่ายแทรกเตอร์ ผศส.๑ และ วศ.คส.๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดการปัญหา โดย ผส.ชป.๑ ได้กำชับให้ถมดินงวดที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ต้องได้ดินถม ๓๕,๐๐๐ ลบ.ม. และงวดที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐) ต้องได้ดินถม ๓๘,๐๐๐ ลบ.ม. รวมเป็นยอดดินถมบดอัดแน่นทั้งหมด ๗๓,๐๐๐ ลบ.ม. งานดินจะแล้วเสร็จและหากในงวดที่ ๑ หากยอดดินถมที่ตกลงไว้ไม่ถึงเป้าหมาย ผส.ชป.๑ จะบันทึกถึง ผส.คก. เพื่อให้นำเครื่องจักรจากส่วนกลางมาทำงาน

๔. ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ หน่วยแทรกเตอร์ไม่ทำงานเฉลี่ยเพียง ๕๐๐ ลบ.ม./วัน เครื่องจักรเสียโดยตลอดเหมือนเดิมและขณะนี้ต้องวิ่งไปเอาน้ำห่างจากจุดก่อสร้าง ๖ กม. รถบรรทุกน้ำต้องใช้เวลารั้ง ๓๐ นาที และมีรถบรรทุกน้ำใช้งานได้เพียง ๒ คันเท่านั้น

แผน - ผลิตปริมาณก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักฯขอประทามที่ ๑  
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์กรมประมง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักฯขอประทามที่ ๑ จักรวรรดิ  
ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

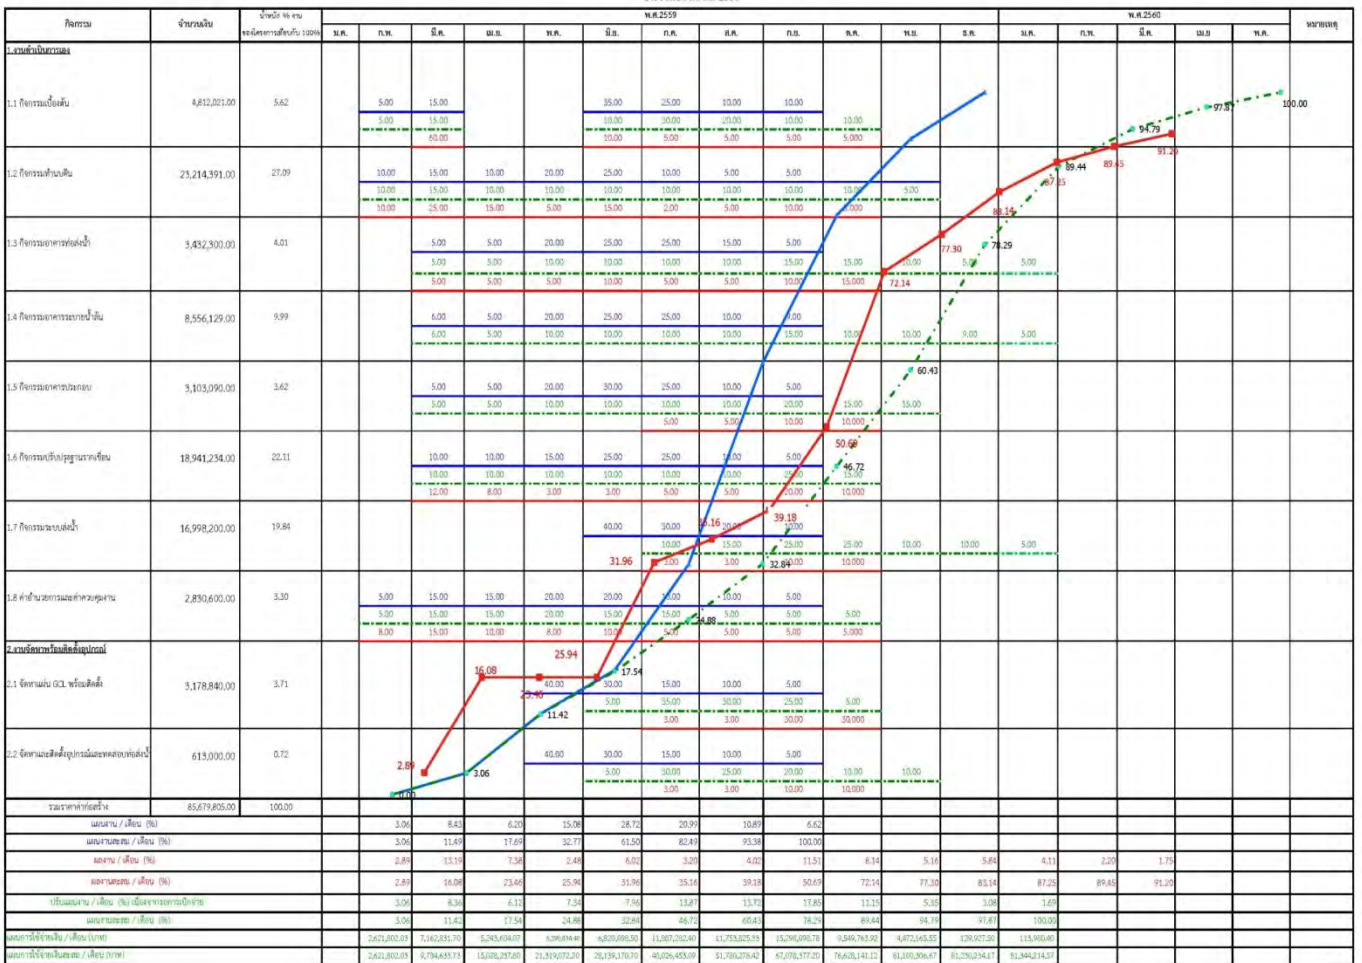




งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ระบบส่งน้ำฝายซ้าย รอบอัดดินและปลูกหญ้า อาคารปลายคลองส่งน้ำฝายซ้ายเหลืองานเรียงหิน เหลืองานระบบส่งน้ำฝายขวา คาดว่างานทำรางรินจะเสร็จก่อนสงกรานต์ ยกเว้นช่วงสะพานน้ำยาว ๑๒๐ เมตร จะทำ หลังสงกรานต์ เพราะหน้างานติดปัญหาทางของทางหลวงชนบยังไม่แล้วเสร็จ ผลงานสะสม ๖๗%




แผน - ควบคุมปริมาณก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานเขตพื้นที่ 1  
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ 2)  
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระยะก่อสร้าง มีนาคม 2560

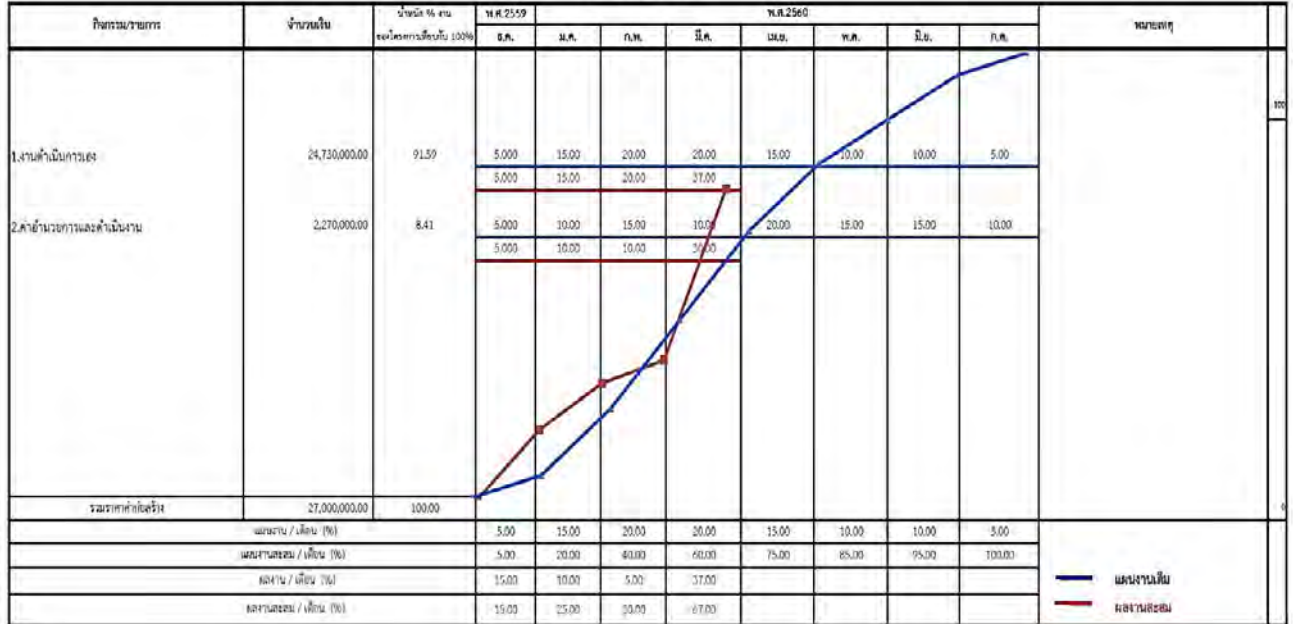

➤ งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

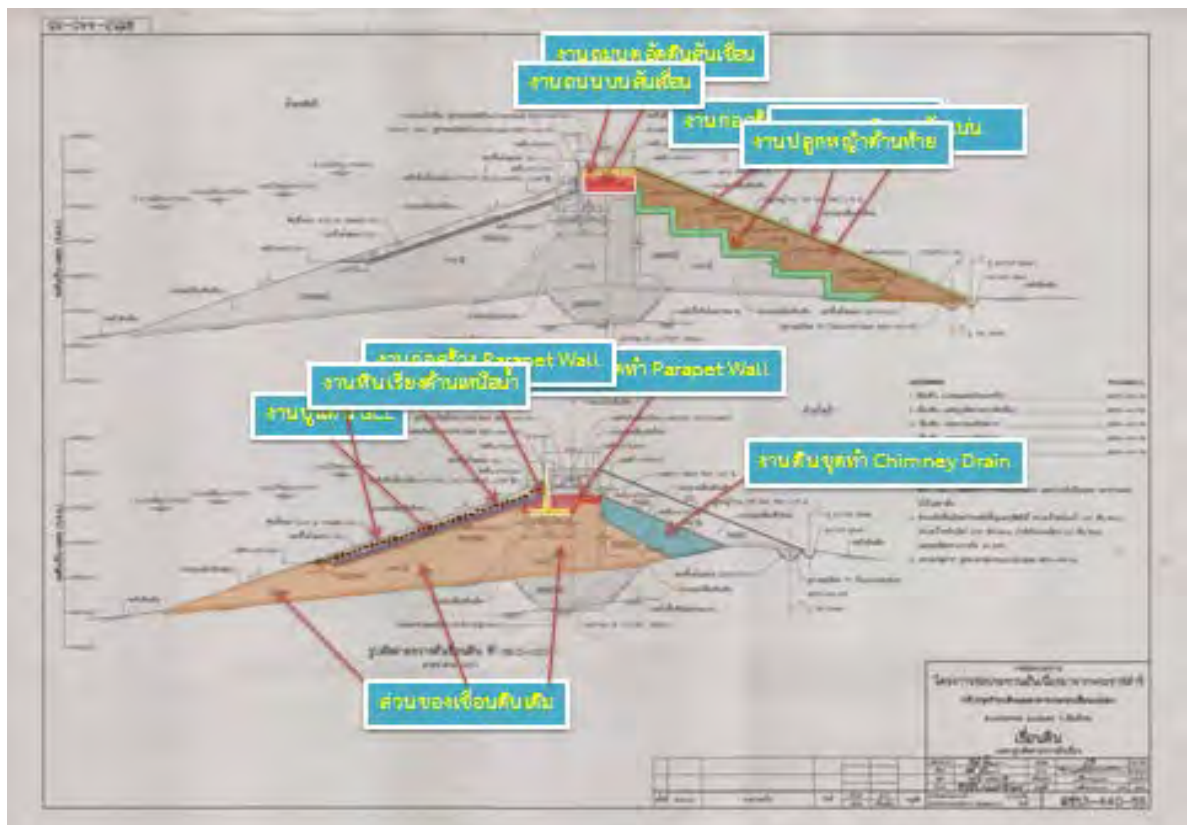



- โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ณาป่ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานทำ Parapet Wall ความยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร ซึ่งจะยาวกว่าอ่างแม่ปอน

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝ่ายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ผศ.๑ และ ผส.ขป.๑ ตรวจสอบดูงาน ผส.ขป.๑ ได้แนะนำให้ทำแนวกันขอบเขตของชลประทานด้วย ปัจจุบันทำสันฝายตัวฟันปลา ได้ ๓ ช่วง จากทั้งหมด ๑๐ ช่วง และคาดว่าตัวสันฝายจะแล้วเสร็จประมาณ ๑๐ พฤษภาคม นี้ ผลงานก่อสร้าง ๗๐ %



### การประชุมชี้แจงระหว่างการก่อสร้าง



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1  
โครงการฝายทวมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย  
บ.ทวมพู ต.ทาบลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน  
ประจำเดือน พ.ย.59 - มิ.ย.60

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % เทียบแต่ละกิจกรรม	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2559				พ.ศ.2560				วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 1 พ.ย.59		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
1.งานดำเนินการเอง														
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	69,507.00	100	0.15									50	50	100
1.2 กิจกรรมค้าฝายและส่วนประกอบ	32,620,866.00	100	72.49			10	15	20	20	20	10	5		80
1.3 ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน	2,452,627.00	100	5.45		5	10	20	20	15	15	10	5		60
2.งานจ้างเหมา														50
2.1 จ้างเหมางานดิน	2,960,000.00	100	6.58			10	20	20	15	10	5			30
2.2 งานจ้างคอกเข้เพื่อเหล็กพร้อมจัดหา	3,135,000.00	100	6.96			50	50							20
2.3 งานจ้างทำบานระบายพร้อมเครื่องยกและติดตั้ง	1,298,000.00	100	2.88							50	50			10
2.4 งานจ้างทำสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้ง	2,464,000.00	100	5.47							50	50			10
รวมราคาค่าก่อสร้าง	45,000,000.00	100	100											0
ผลงาน / เดือน (%)					0.27	11.93	16.75	16.89	16.62	19.03	12.70	5.74		
แผนงานสะสม / เดือน (%)					0.27	12.2	28.95	45.84	62.64	81.49	94.19	100		
ผลงาน / เดือน (%)					2	13	20	17	18					
แผนงานสะสม / เดือน (%)					2	15	35	52	70					

รูปปัญหาอุปสรรค.....



กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาสาวย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน งานบดอัดท้ายเขื่อนแล้วเสร็จ มีการทดสอบความแน่นชั้นดินแต่ละชั้น ปรับแต่งSlope และจะเร่งขุดร่องแกนให้เสร็จก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน หลังสงกรานต์ก็จะเริ่มบดอัดร่องแกน ผลงานสะสมปัจจุบัน ๕๖% ช้ากว่าแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐





วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ผส.ชป.๑ เข้าตรวจเยี่ยม ดูนาน



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1  
โครงการปรับปรุงถนนด้วยน้ำขี้เถ้าแฉะดินล่างขึ้นเนินมาจากพระราชดำริ  
ตำบลหนองปลาสาวย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % รวมของโครงการ	พ.ศ.2559		พ.ศ. 2560								
					พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
<b>1.งานดำเนินการก่อสร้าง</b>															
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	18,273,771.71	37.01	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00			
1.2 กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักร	58,000.00	ลบ.ม.	1,517,280.00	3.07			20.00	20.00	20.00	20.00					
1.3 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% SPCT	75,310.00	ลบ.ม.	3,901,058.00	7.90				5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00		
1.4 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% SPCT	5,040.00	ลบ.ม.	250,236.00	0.51					20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		
1.5 กิจกรรมปูนขาว CaO65% บรรจุถุงละ 25 กก. (3% Hydrate Lime)	63,924.00	ถุง	16,620,240.00	33.66					30.00	40.00	30.00				
1.6 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% SPCT (Stabilizing zone)	3,050.00	ลบ.ม.	174,460.00	0.35					20.00	30.00	30.00	20.00			
1.7 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วย Lime Treatment ด้วยเครื่องจักร 95%SPCT	35,000.00	ลบ.ม.	1,813,000.00	3.67					10.00	30.00	30.00	30.00			
1.8 กิจกรรมงานหินทิ้ง RockFillToe	1,240.00	ลบ.ม.	691,920.00	1.40										50.00	50.00
1.9 กิจกรรมงานคอนกรีตคานา GUTTER DRAIN	237.00	ลบ.ม.	934,017.00	1.89										50.00	50.00
1.10 กิจกรรมป้องกันกริดเซาะ	1.00	งาน	2,054,281.00	4.16										50.00	50.00
1.11 ค่าขนย้ายการ	1.00	งาน	3,149,736.29	6.38											
รวมราคาค่าก่อสร้าง			49,380,000.00	100.00											
แผนงาน / เดือน (%)					4.66	7.44	17.98	23.12	19.79	9.69	6.09	7.18	4.05		
แผนงานสะสม / เดือน (%)					4.66	12.10	30.08	53.20	72.99	82.68	88.77	95.95	100.00		
ผลงาน / เดือน (%)					2.81	5.59	15.37	20.28	12.59						
ผลงานสะสม / เดือน (%)					2.81	8.40	23.77	44.05	56.64						



- ฝ่ายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตัวฝายเสร็จแล้ว  
เหลืองานเรียงหินด้านหน้าและด้านท้ายตัวฝาย ระบบส่งน้ำประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร ทำไปแล้ว ๑,๔๐๐ เมตร คาดว่า  
เดือนพฤษภาคมจะแล้วเสร็จทั้งตัวฝายและระบบ ผลงานสะสม ๕๔ %





แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1  
โครงการจ่ายน้ำห้วยไคร้(ลูกที่2) พร้อมระบบส่งน้ำ  
ตำบลแม่ละ อำเภอลำปาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % ของโครงการ	พ.ศ.2559		พ.ศ. 2560						
					ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
<b>1.งานตัวเป็นความอง</b>													
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	1,408,912.27	3.81	5.00	10.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	5.00	
1.2 กิจกรรมสายคอนกรีต	1.00	แห่ง	12,049,941.46	32.57	5.00	10.00	25.00	25.00	20.00	15.00			
1.3 กิจกรรม ทรม.ปากคลอง	1.00	แห่ง	313,967.55	0.85				100.00					
1.4 กิจกรรมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	2,131.00	เมตร	20,459,480.75	55.30	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	25.00	15.00		
1.5 ค่าอำนาจการ	1.00	งาน	2,768,898.61	7.48	15.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง			37,000,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)					5.71	10.66	18.32	18.79	16.13	14.50	6.66	6.09	3.14
แผนงานสะสม / เดือน (%)					5.71	16.37	34.69	53.48	69.61	84.11	90.77	96.86	100.00
ผลงาน / เดือน (%)					5.83	10.66	20.14	18.54					
ผลงานสะสม / เดือน (%)					5.63	16.29	36.83	54.97					

➤ รายงานความก้าวหน้างานเตรียมความพร้อม งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- โครงการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า

ได้เข้าพื้นที่ดูงานพร้อมโดยสำนักงบประมาณ ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว และอาจารย์ชูโชค ซึ่งงานนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับจังหวัดได้ และสำนักงบประมาณได้เน้นย้ำ ขอให้ทำข้อผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐



- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายรูบัววน สนับสนุนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลสันทราย อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเข้าไปการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ผู้ใหญ่ กำนัน กลุ่มผู้ใช้น้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วัดสันตันคู ส่วนใหญ่เห็นชอบให้ดำเนินการงานก่อสร้างดังกล่าว แต่ก็มีชาวบ้านกลุ่มผู้เลี้ยงปลา ซึ่งไม่ได้เข้ามาประชุมด้วย จะขอปรึกษาเรื่องการเปิด/ปิดน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเลี้ยงปลา และคาดว่าจะเริ่มงานได้เดือนพฤษภาคม



กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ระบบส่งน้ำฝายตินธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุทธชาย พรหมมลมาศ ผศส.๑ ลงพื้นที่ตรวจงานระบบส่งน้ำฝายตินธาตุและได้สอบถามเรื่อง FTO ซึ่งในแบบมีแค่ ๓ จุด จึงแนะนำให้ทำบันทึกแจ้งกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อนที่จะมีการส่งมอบงานวางรินแล้วเสร็จ เหลืองงานดาต ๑.๕ กม. ผลงานสะสม ๖๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐







แผน - ผลปฏิบัติการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑  
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำสายดิบขาด  
ตำบลแสนโพธิ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีเปลี่ยน งบประมาณปี 2560

กิจกรรมรายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ ปีงบประมาณเดิม(ปี) 100%	พ.ศ.2559				พ.ศ.2560				
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.งานจ้างเหมา	4,504,200.00	19.01	15.00	20.00				30.00	25.00		
2.งานดำเนินการก่อสร้าง	25,180,700.00	84.54	5.00	15.00	20.00	20.00	5.00	10.00	10.00	5.00	
3.ค่าดำเนินการและค่าเป็นงาน	135,100.00	0.45	5.00	15.00	20.00	20.00	13.00	10.00	10.00	5.00	
รวมรายการทั้งหมด	50,000,000.00	100.00									
	แผนก (%) / เดือน (%)		5.00	16.00	17.00	17.00	16.00	12.00	9.00	4.00	
	แผนกสะสม (%) / เดือน (%)		5.00	22.00	39.00	56.00	72.00	84.00	93.00	97.00	
	แผนก / เดือน (%)		10.00	10.00	25.00	15.00					
	แผนกสะสม / เดือน (%)		10.00	20.00	45.00	60.00					



กส.๔ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝ่ายนาหมากปิ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ตัวฝายฝั่งซ้ายงานคอนกรีตแล้วเสร็จ เรียงหินด้านหน้าได้ ๓๐ เมตร กำแพงฝั่งขวาเทคอนกรีตด้ายท้ายแล้วยังเหลือช่วง  
ด้านหน้า ด้านหน้าฝายเทพื้นแล้ว เหลือตัวสันฝาย ๒ ช่องประมาณ ๑๕ เมตร ระบบส่งน้ำสาย ๑ RIMC ๑,๒๐๐ เมตร  
ทำไปแล้ว ๑ กม. ผลงานสะสม ๖๐%







รายการ	วงเงิน	รับราคา	อนุมัติแผน	รับ RQ	ประกาศ-ยื่น เปิดซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ชนะ อนุมัติรับราคา	ใบสั่งสัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	ข้ามตัว
<b>สอปชุด 1</b>														
1	หินใหญ่ อมป.	1,830,700.00		15 มี.ค. 60	27 มี.ค. 60	7-18 เม.ย. 60	20 เม.ย. 60	25 เม.ย. 60						
2	ปูน อมป.	992,400.00				*	*	*						
3	แผ่นใยสังเคราะห์ อมป.	640,700.00				*	*	*						
4	คอนกรีตผสมเสร็จ อมป.	1,980,000.00				*	*	*						
<b>สอปชุด 2</b>														
1	แผ่นไม้ยึด อมป.	1,055,000.00				11-21 เม.ย.60	25 เม.ย. 60	28 เม.ย. 60						
2	หินลูกรัง อมป.	652,000.00				*	*	*						
3	แผ่นใยสังเคราะห์ อมป.	1,641,300.00				*	*	*						
4	หินย่อย เบอร์ 2 อมป.	682,400.00				*	*	*						
<b>สอปชุด 3</b>														
1	คอนกรีตผสมเสร็จ อมป.	1,434,400.00				17-27 เม.ย.60	1 พ.ค. 60	4 พ.ค. 60						
2	แผ่นไม้ยึด อมป.	1,229,700.00				*	*	*						
3	กรวดเบอร์ 2 อมป.	1,983,400.00				*	*	*						
4	ทรายหยาบ อมป.	837,300.00				*	*	*						
<b>สอปชุด 4</b>														
1	หินใหญ่ อมป.	761,600.00				19 เม.ย-1พ.ค.60	3 พ.ค. 60	5 พ.ค. 60						
2	แผ่นใยสังเคราะห์ อมป.	1,278,800.00				*	*	*						
3	แผ่นไม้ยึด อมป.	1,055,000.00				*	*	*						
4	หินลูกรัง อมป.	1,314,300.00				*	*	*						
<b>ตกลง/กรณีพิเศษ</b>														
1	ไม้แปรรูป อมป.	1,953,900.00				3 เม.ย. 60								
2	ไม้แปรรูป อมป.	2,451,000.00				5 เม.ย. 60								
3	เสาไม้ยูคา อมป.	199,300.00				4 เม.ย. 60								
4	Rubber อมป.	248,700.00				4 เม.ย. 60								
5	เสาไม้ยูคา อมป.	216,600.00				7 เม.ย. 60								
6	Rubber อมป.	295,500.00				7 เม.ย. 60								
7	หินย่อย อมป.	351,400.00												

รายการ	วันที่ได้	วงเงิน	รับราคา	จำนวน	เปิดจ่าย	ใบสั่งสัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	
6	ค.16	cps	1,633,400.00	933,530.00	599 ตม		14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	3 เม.ย.60	20 วัน 2	ขออนุมัติปรับและแจ้งปรับ 28 มี.ค. 60
												4.2 3 เม.ค. 60
7	ต.20	ซ.โมทอ	1,612,000.00	1,484,900.00	620.00		14 ธ.ค.59	19 ธ.ค.59	20 ธ.ค.59	3 เม.ย.60	30 วัน	ขออนุมัติปรับและแจ้งปรับ 28 มี.ค. 60
												4.2 13 เม.ค. 60
9	ปูนขาว Cao	ยทท	ซ.โมทอ	16,620,300.00	8,289,664.32				3 เม.ย.60	90 วัน	4.2 28 เม.ค. 60	ผลททมา 24 มี.ค. 60
												4.3 27 พ.ย. 60
							เริ่มสัญญา	ครบสัญญา				
10	จ้างงานดิน	ผ.ง.01	sps	1,985,600.00	1,471,500.00		12 เม.ค. 60	17 เม.ค. 60	16 พ.ค. 60		120 วัน	
11	จ้างงานดิน	ผ.ง.01	ศรีชาติ	2,960,000.00	1,459,797.36		12 เม.ค. 60	17 เม.ค. 60	15 พ.ค. 60		180 วัน	
12	จ้างงานดิน	ผ.ง.02	ซ.โมทอ	4,504,200.00	2,394,558.60		12 เม.ค. 60	17 เม.ค. 60	15 พ.ค. 60		180 วัน	
14	จ้างทำงาน	ผ.ง.04	วรรณภูมิ	2,464,000.00	2,448,000.00		20 ก.พ. 60	22 ก.พ. 60	21 ก.ค. 60		150 วัน	
15	จ้างทำงาน	ผ.ง.07	บีบีซี	1,298,000.00	1,275,000.00		15 มี.ค. 60	18 มี.ค. 60	15 ก.ค. 60		120 วัน	



สรุปประเด็นความแตกต่าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535	ระเบียบฯ พ.ศ. 2549	พรบ.
ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ การพัสดุ โดยใช้งบประมาณเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ	ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่บังคับบัญชาหรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร	ขอบเขตการใช้บังคับ ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์การร่วมลงทุนของรัฐ เอกอัครราชทูต หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือเนกัวกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่กำหนดยกเว้นกฎกระทรวง
เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ก่ออย่างเป็นธรรม	เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ก่ออย่างเป็นธรรม	หลักการจัดซื้อจัดจ้าง - คู่คุณค่า - โปร่งใส ต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ มีกรวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้า - ตรวจสอบได้
เมื่อทราบยอดเงิน ให้ส่วนราชการรีบดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานแบบของการจัดซื้อจัดจ้าง	เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2535	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อทราบยอดเงินให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ
	องค์ประกอบของคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ให้มีการรวมการซึ่งเข้าบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำอย่างน้อยหนึ่งคน	การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันทุจริต
	ให้คณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิสืบข้อมูลเอกสารประกวดราคาที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกวดราคาที่สามารถเผยแพร่ได้ ลงประกาศในเว็บไซต์ของ 2 หน่วยงาน	การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การประกาศเชิญชวน ราคากลาง แผนพักรับทราบรายชื่อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ
	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2555 กำหนดให้ หน่วยงานต่างๆ ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีสอบราคา ประกวดราคา e-Auction) เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 2 หน่วยงาน	การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและการบริหารสัญญา

	ปัจจุบัน วิธี e-Market, e-Bidding มีการกำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานของประเทศไทยในข้อ 2 หน่วยงาน	
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (ก.พ.)	คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.)	<p><b>คณะกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>* คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>* คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</li> <li>* คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการค้าทุจริต</li> <li>* คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน</li> </ul>
ให้ใช้ราคามาตรฐาน หรือราคาากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือราคาที่ได้ประกาศท้องตลาด	เพิ่มเติวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2555	<p><b>ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด</li> <li>(2) ราคาอ้างอิงของพัสดุ</li> <li>(3) ราคามาตรฐาน (สงป./คท)</li> <li>(4) ราคากลางท้องตลาด</li> <li>(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ</li> <li>(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแบบทางปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ</li> </ol>
-	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2555 กำหนดให้หน่วยหน่วยงานภาครัฐใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางก่อนร่างของทางราชการที่บทความและปรับปรุงใหม่ * ระบบคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์	<p><b>กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</b></p> <p>คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด และประกาศในระบบบัญชีสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและในราชกิจจานุเบกษา</p>
การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นไม่การจัดซื้อหรือการจัดจ้าง แต่จะส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นแตกต่างกัน	เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2535	<p><b>การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ</b></p> <p>กำหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ประกาศและขึ้นทะเบียนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด</p>



			<p>การมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญา</p> <p>ในการจัดจ้างผู้ทำหน้าที่ดำเนินการ เช่นเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ ผู้ชำนาญการผู้ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาในงานนั้น</p> <p>วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป</li> <li>2. วิธีคัดเลือก</li> <li>3. วิธีเฉพาะเจาะจง</li> </ol>
ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด	ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด	วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบทางปฏิทินการรหัสพัสดุ e-market/e-bidding	<p>เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p> <p>การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้พิจารณาประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญโดยคำนึงถึงเกณฑ์ต่างๆ ด้านคุณภาพประกอบไปด้วยไม่จำเป็นต้องใช้ราคาต่ำสุด</p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ</p> <p>เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกพักการเสนอราคาหรือทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ</p> <p>การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทางหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัติมีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงานจะได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นที่นอกเหนือจากนี้</p>
	การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น การอุทธรณ์ผลการพิจารณา		<p>การอุทธรณ์</p> <p>หมวด 14 การอุทธรณ์ พิจารณา โดยกรมการพิจารณาอุทธรณ์</p>
หมวดที่ 1 ส่วนที่ 3 บทกำหนดโทษ ผู้ดำเนินการรับโทษทางวินัย และไม่เป็นเหตุหลุดพ้นจากความผิดทางแพ่งและอาญา	เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2535		<p>บทกำหนดโทษ</p> <p>เจ้าหน้าที่หรือผู้ชำนาญการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือโดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือผู้สนับสนุนรับโทษตามที่กำหนดไว้</p>

**งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้**

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

- ฝ่ายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๘๐.๔๗%
- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ เบิกจ่ายได้ ๘๓.๔๓%
- ฝ่ายนาหมากปิ่น พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๖๕.๒๒%
- ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา เบิกจ่ายได้ ๙๐.๖๑%
- ฝ่ายท่าชมพู พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๗๙.๖๑%
- อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว เบิกจ่ายได้ ๔๔.๔๙%

**เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๘**

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

**รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหาร โดยคุณจินตนา ชูดวง ดังนี้**

- กำชับให้ลูกจ้างชั่วคราวจัดทำแบบรายงานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จ และส่งให้ บท.คส.๑ เพื่อรวบรวมส่ง ผคส.๑ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

**ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้**

- รายงานการใช้น้ำมันเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๕๐๑ ลิตร ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ ๒๐ %
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗,๕๒๒ หน่วย เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ ๕๙%

**ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560**

**การใช้น้ำมัน**

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,571	2013	28%	-	-
กุมภาพันธ์	1,907	1873	-	2%	-
มีนาคม	2,060	1501	-	27%	ลดลงจากเดือน ก.พ. 60 ประมาณ 20%
เมษายน	1,404	-	-	-	-
พฤษภาคม	1,918	-	-	-	-
มิถุนายน	1,546	-	-	-	-
กรกฎาคม	1,561	-	-	-	-
สิงหาคม	1,349	-	-	-	-
กันยายน	1,107	-	-	-	-
ตุลาคม	868	-	-	-	-
พฤศจิกายน	3,412	-	-	-	-
ธันวาคม	1,618	-	-	-	-



การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	5759	4899	-	15%	-
กุมภาพันธ์	4255	4721	11%	-	-
มีนาคม	7358	7522	22%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 60 ประมาณ 59%
เมษายน	8414	-	-	-	-
พฤษภาคม	9878	-	-	-	-
มิถุนายน	9201	-	-	-	-
กรกฎาคม	7883	-	-	-	-
สิงหาคม	8210	-	-	-	-
กันยายน	8580	-	-	-	-
ตุลาคม	7443	-	-	-	-
พฤศจิกายน	7874	-	-	-	-
ธันวาคม	6588	-	-	-	-


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



นางจินตนา ชูดวง  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

